
الموقع العام وتنسيق الحديقة (لاندسكيب)

الأرض 10 × 30 م = 300 م² | الأبعاد بالسنتيمتر

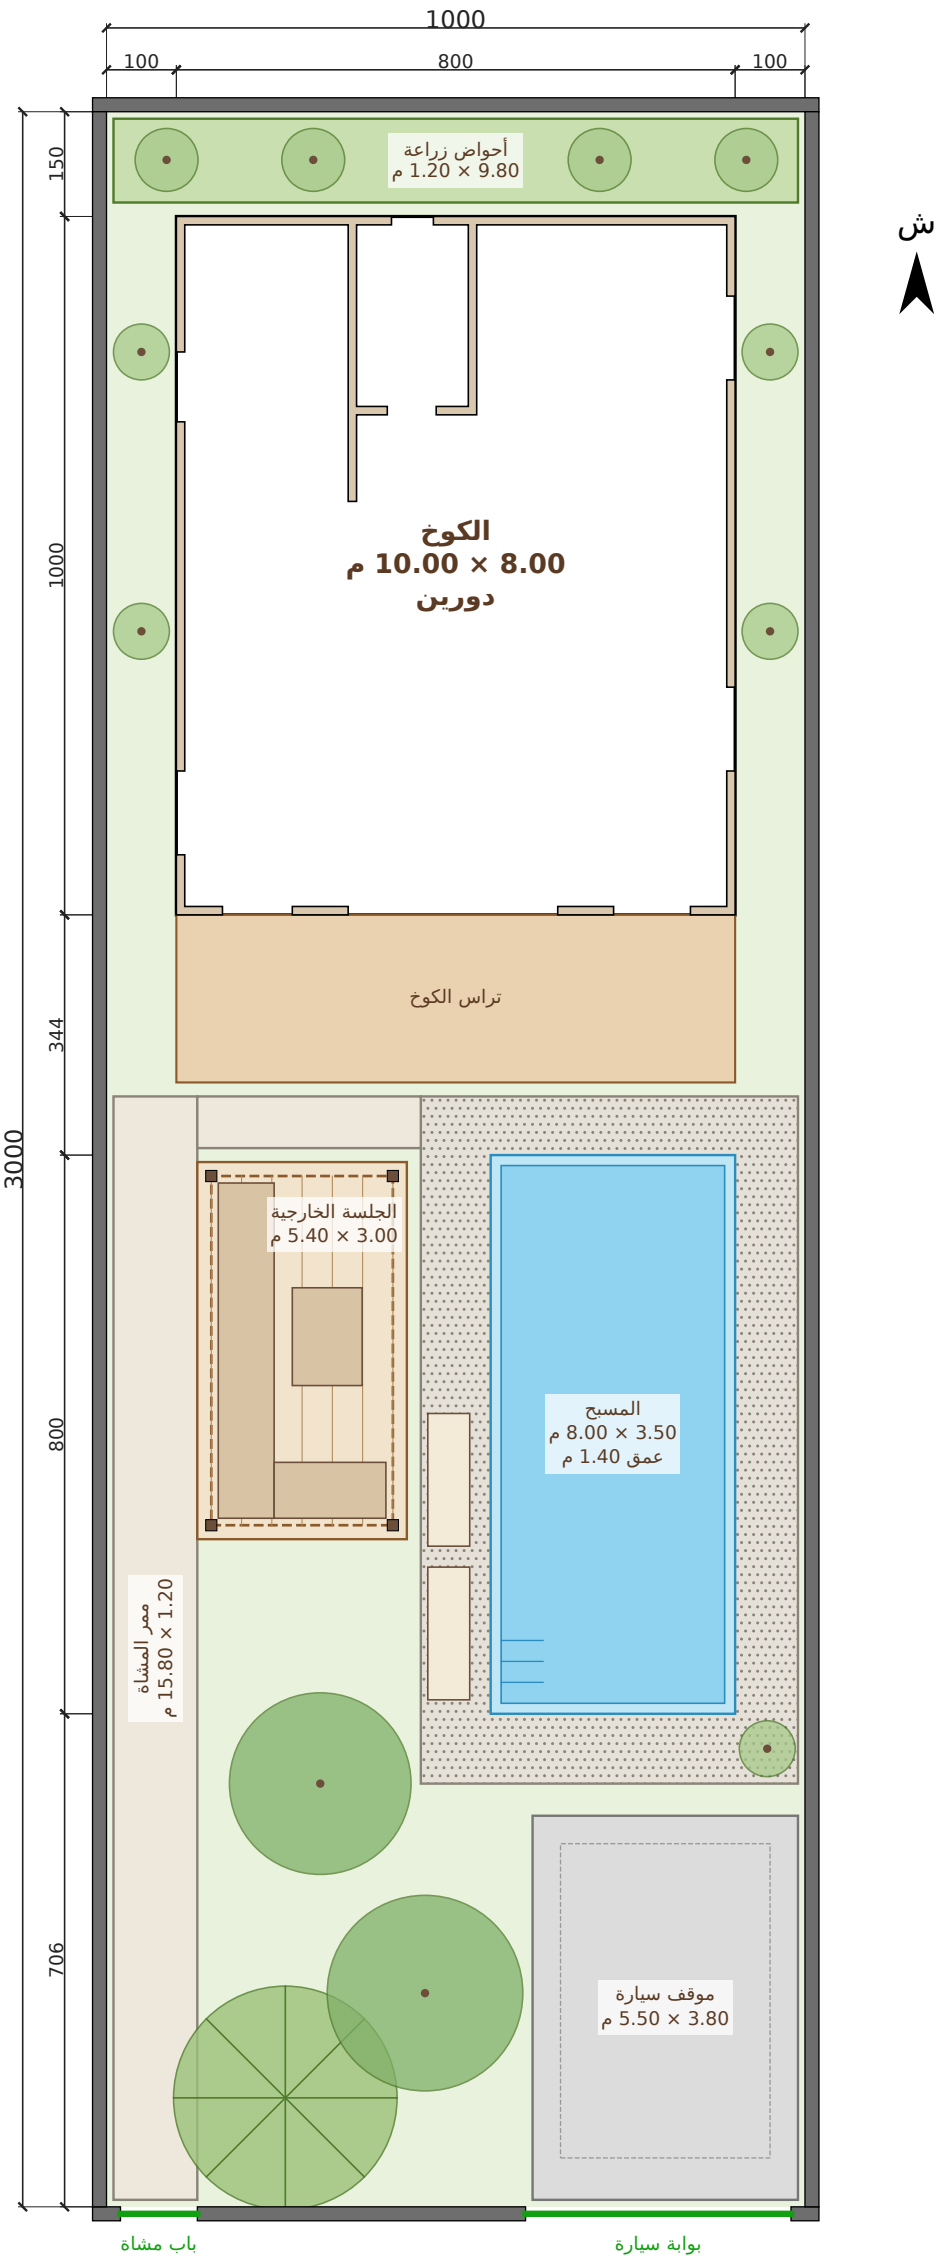

شارع عرض 16 م

جدول مساحات الموقع

البند	المقاس	المساحة (م²)
مساحة الأرض	30.00 × 10.00 م	300.0
مسطح الكوخ (البصمة)	10.00 × 8.00 م	80.0
تراس الكوخ	2.40 × 8.00 م	19.2
مسبح	8.00 × 3.50 م	28.0
جلسة خارجية	5.40 × 3.00 م	16.2
بلاط		25.1
موقف سيارة	5.50 × 3.80 م	20.9
ممر		21.3
أحواض زراعة	9.80 × 1.20 م	11.8
المسطحات الخضراء (حديقة)	الباقي	77.5


- الكوخ في آخر الأرض بعيد عن الشارع (خصوصية)، والصالة والبلكونة يطلّون على المسبح والحديقة.
- بوابة سيارة 3.80 م + باب مشاة مستقل، سور بلك 2.50 م بغطاء خشب أعلى السور.
- ممر المشاة من الباب للتراس بمحاذاة السور الغربي، والموقف عند البوابة بدون ما يقطع الحديقة.
- المسبح 3.50 × 8.00 م بعمق 1.40 م، حوله بلاط ودرج نزول، وكراسي استلقاء على الجهة الغربية.
- جلسة خارجية تحت برجولة خشب بين المسبح والسور، وظل أشجار من جهة الشارع.
- بلكونة بطول الواجهة على الدور الأول، أعمدة خشب من الأرض للسقف، والسقف ممتد 2 م يغطيها.

المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة **عميل جديد — جدة**	**الموقع العام واللاندسكيب**	**1:200**	**2026-10-18**	**A-01 (1/15)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

المسقط الأفقي مع الفرش — الدور الأرضي


الأبعاد بالسنتيمتر - الجدران: قوائم 7×5 + تلبيس 2.5 من الجهتين (12 سم) | منسوب الأرضية +0.00

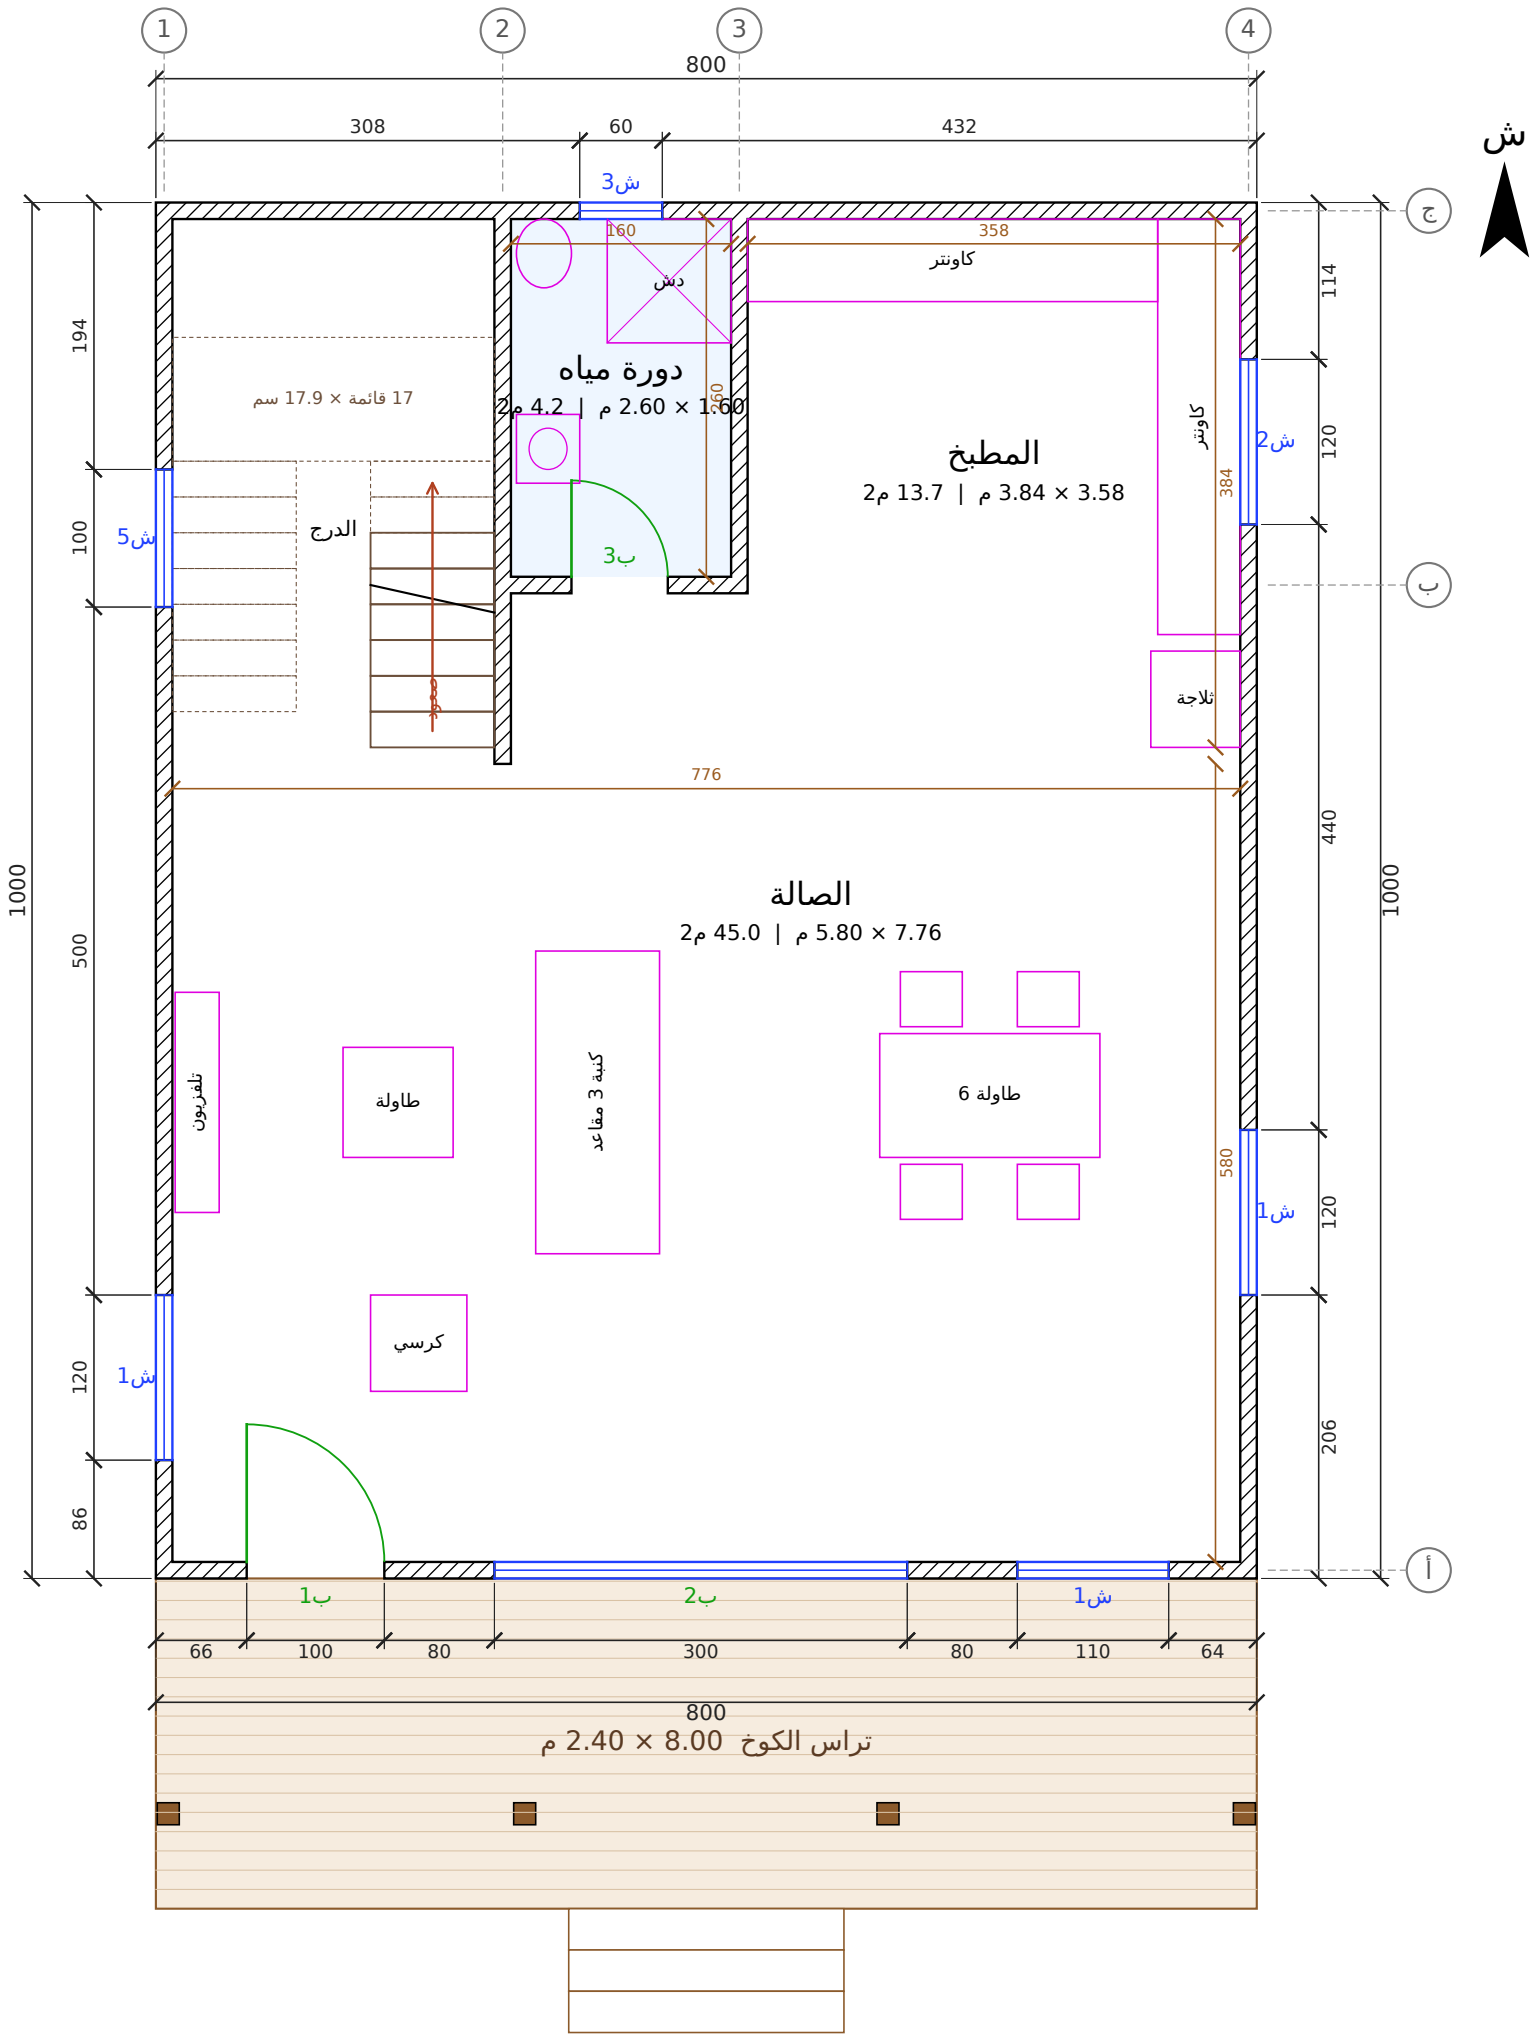


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory **كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة** **عميل جديد — جدة**	**المسقط الأفقي — الدور الأرضي**	**1:50**	**2026-10-18**	**A-02 (2/15)**

المسقط الأفقي مع الفرش — الدور الأول

الأبعاد بالسنتيمتر - الجدران: قوائم 7×5 + تلبيس 2.5 من الجهتين (12 سم) | منسوب الأرضية +3.05

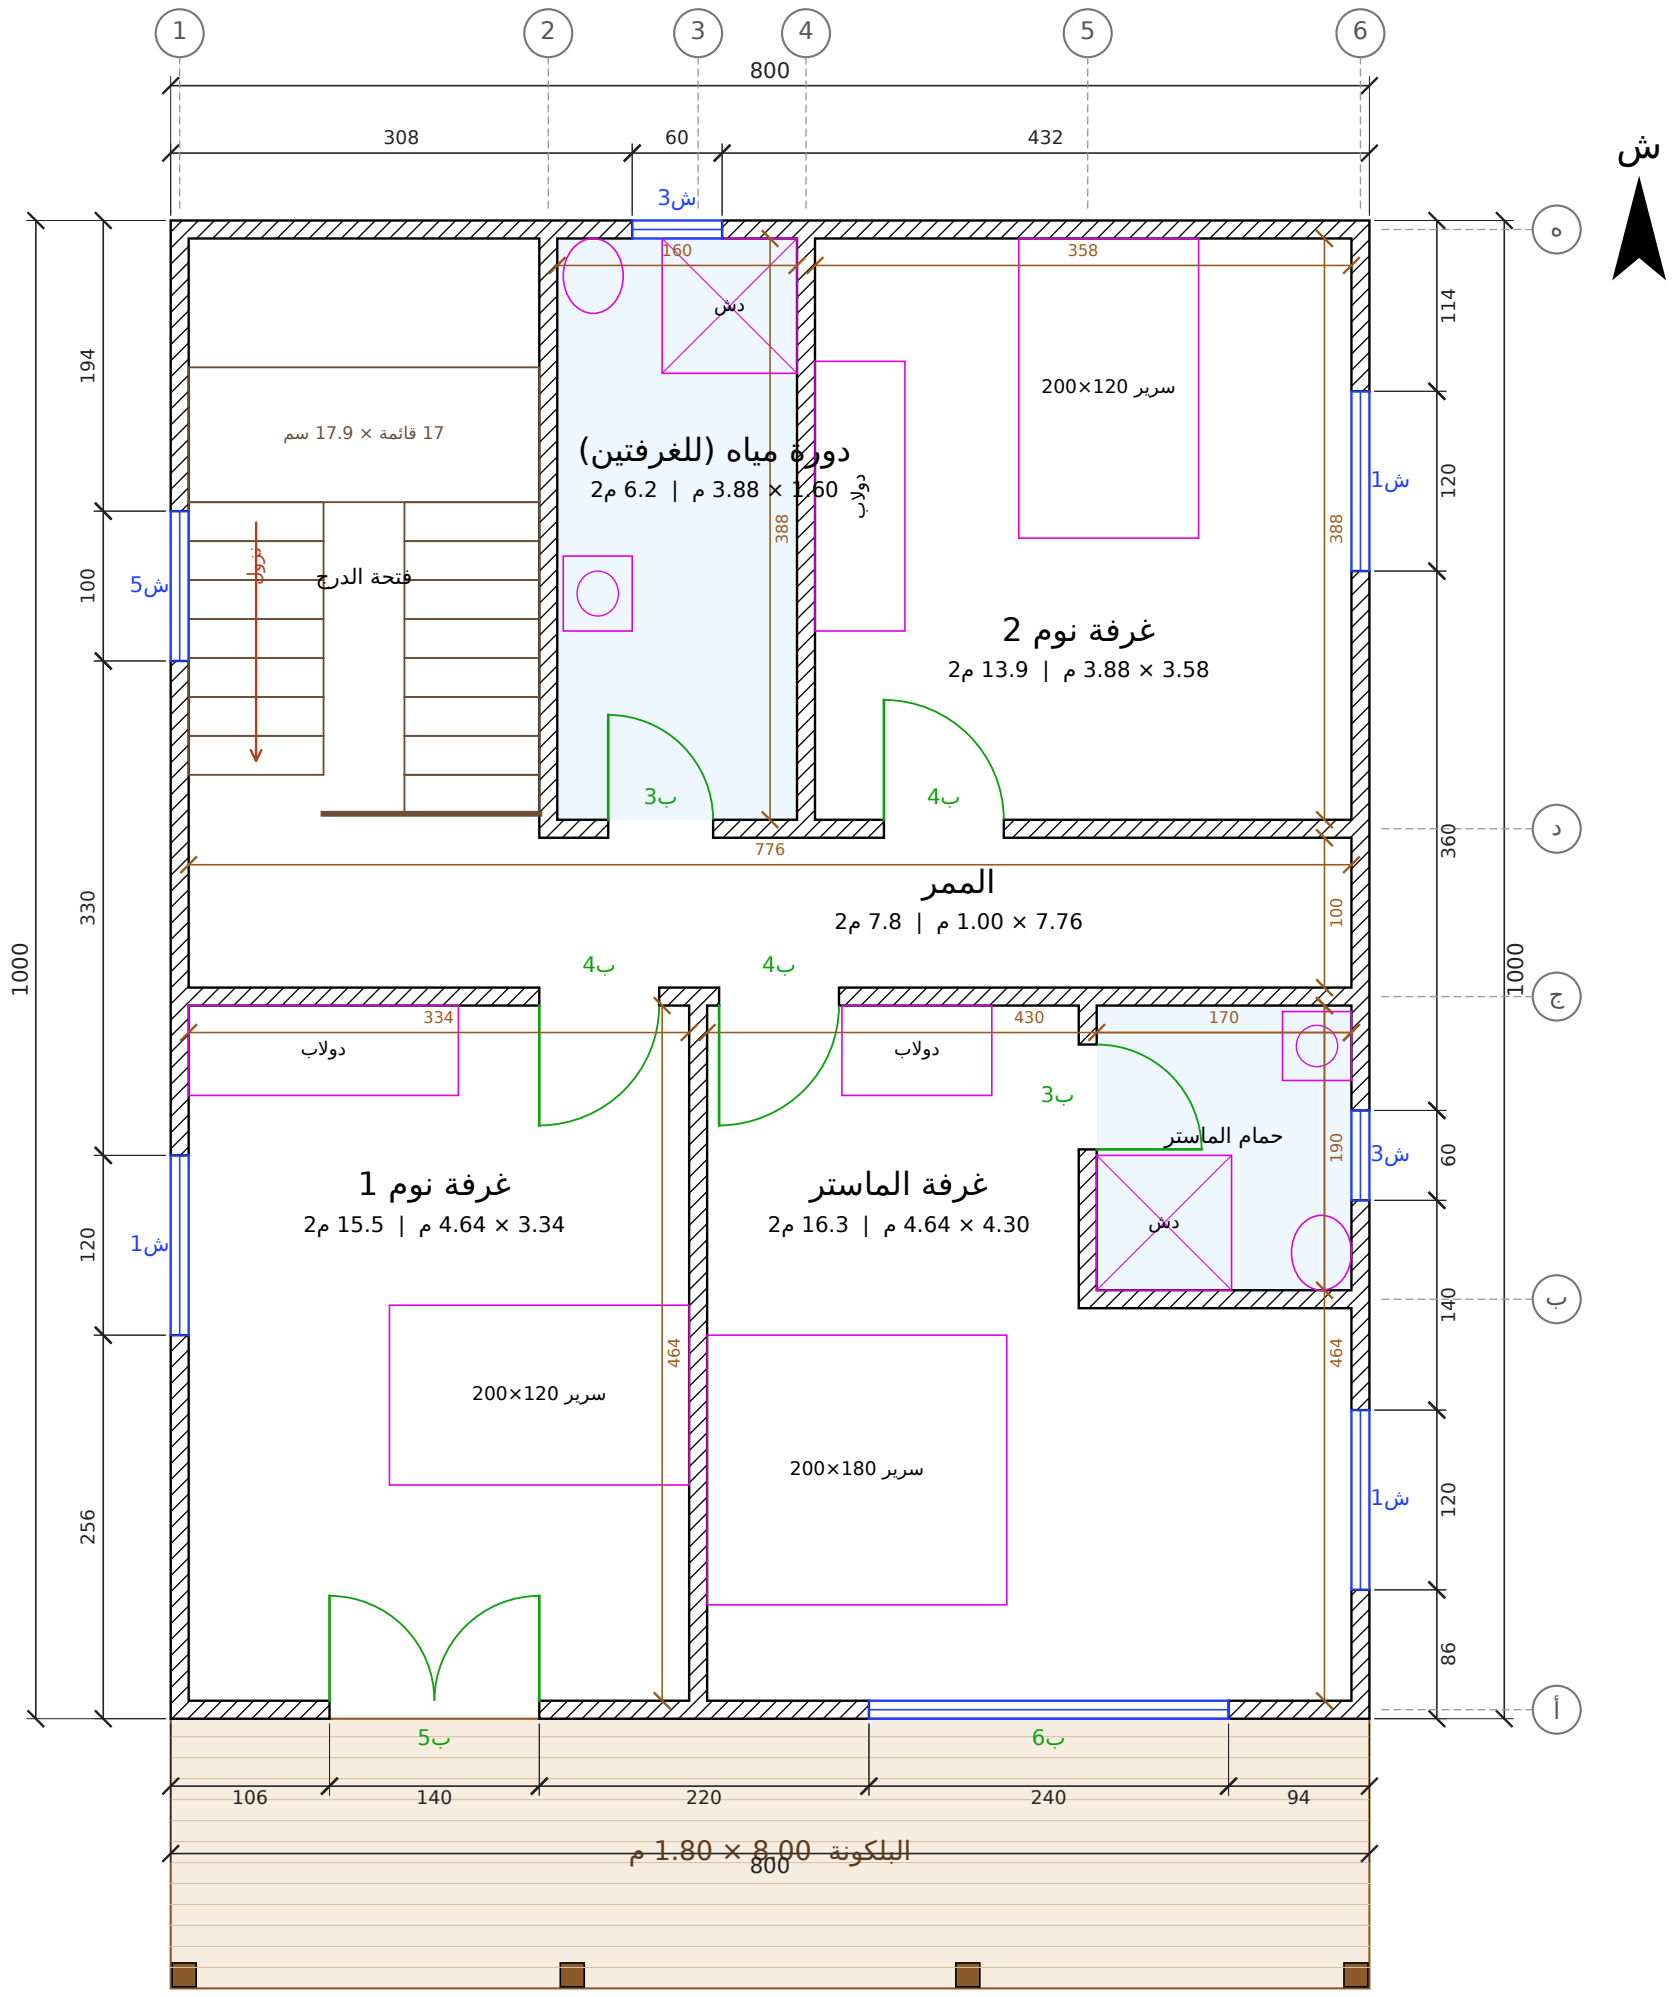


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
مصنع وتد الأخشاب Watad Wood Factory **كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة** **عميل جديد — جدة**	**المسقط الأفقي — الدور الأول**	**1:50**	**2026-10-18**	**A-03 (3/15)**

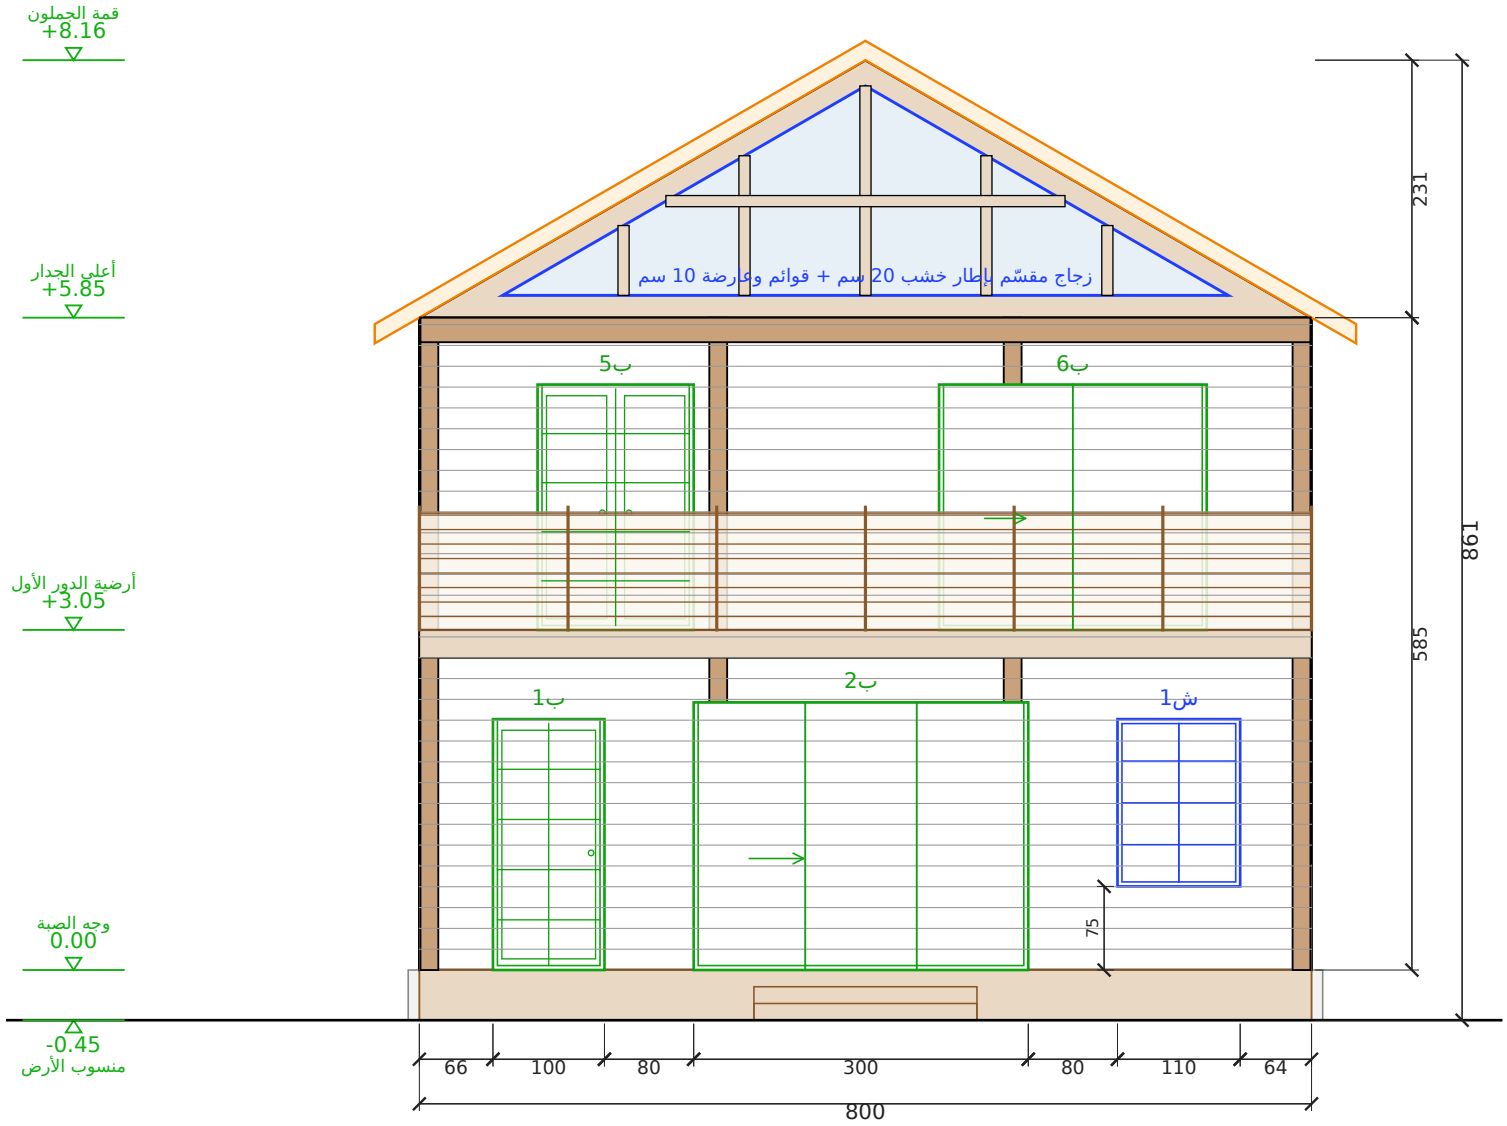

الواجهة الأمامية (على الحديقة)

مقياس 1:50 | الوحدة: سم

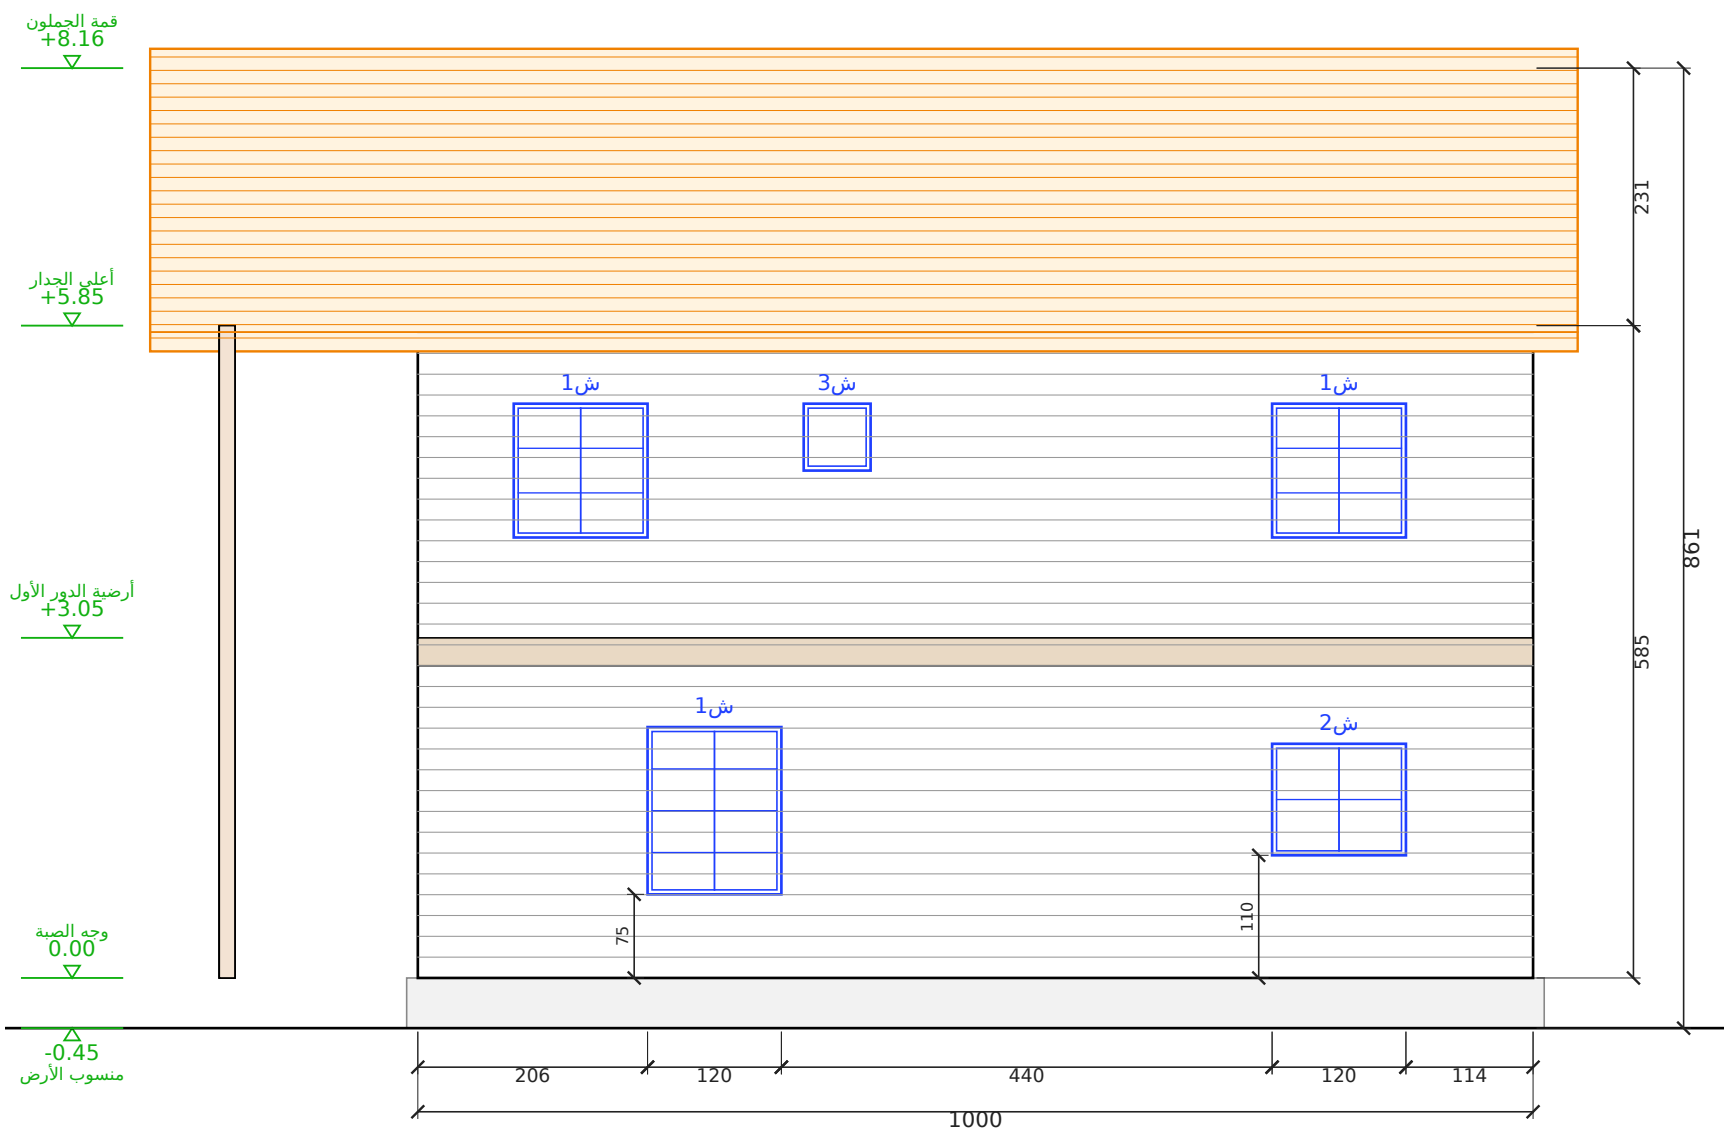


الواجهة الشرقية

مقياس 1:50 | الوحدة: سم


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة عميل جديد — جدة	الواجهة الأمامية (على الحديقة) والواجهة الشرقية	1:50	2026-10-18	A-04 (4/15)

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

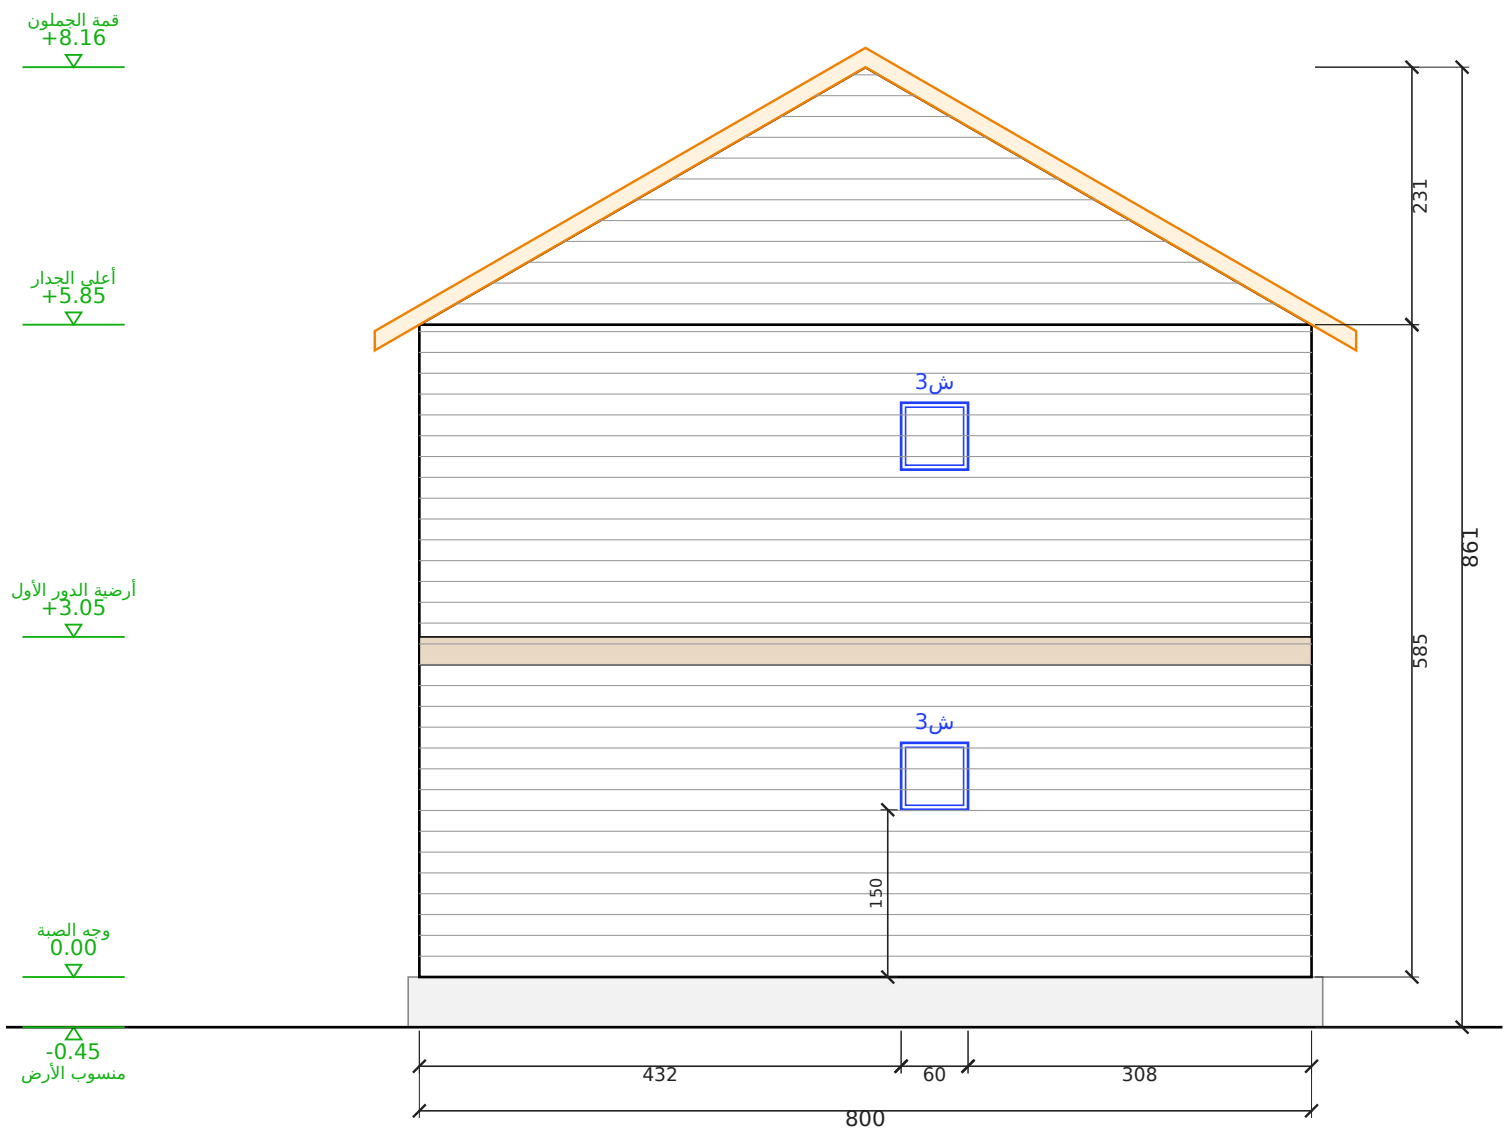

الواجهة الخلفية

مقياس 1:50 | الوحدة: سم

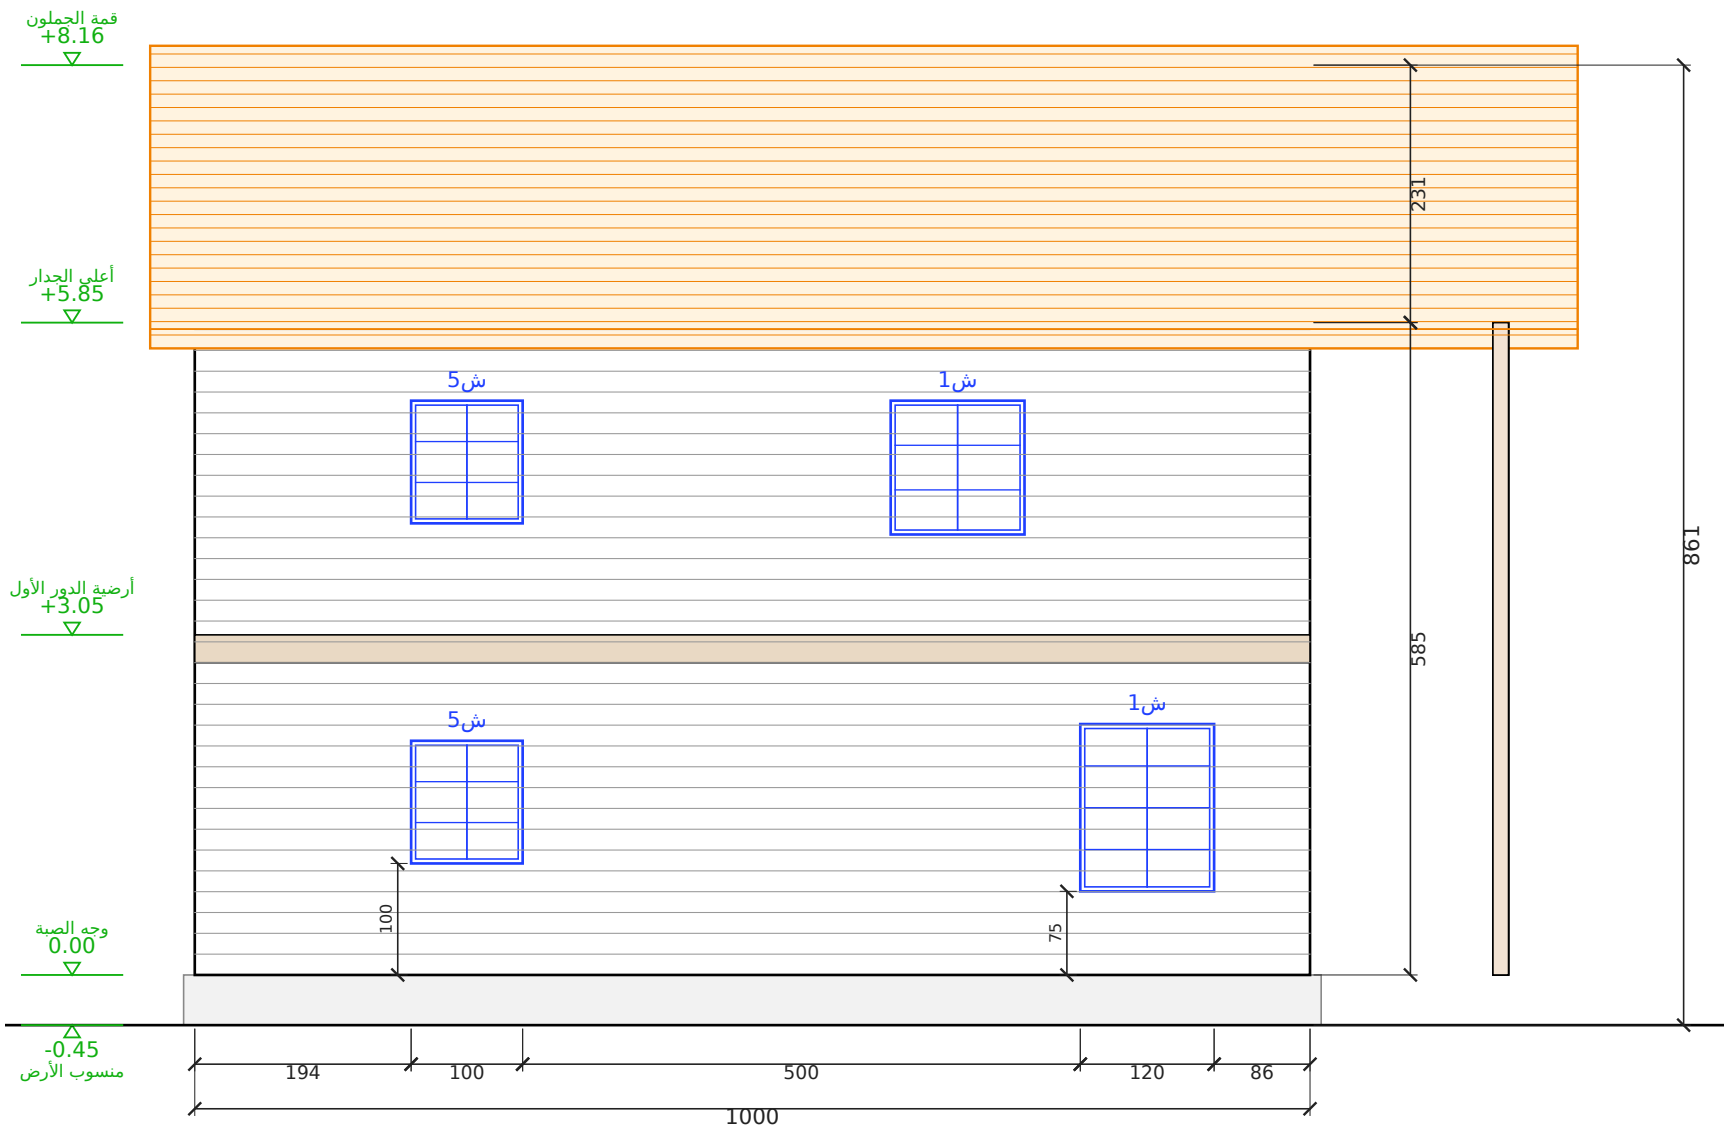


الواجهة الغربية

مقياس 1:50 | الوحدة: سم


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة **عميل جديد — جدة**	**الواجهة الخلفية والواجهة الغربية**	**1:50**	**2026-10-18**	**A-05 (5/15)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory


مسقط السقف (جملون)
رفرف 40 سم من كل جهة | مقياس 1:50

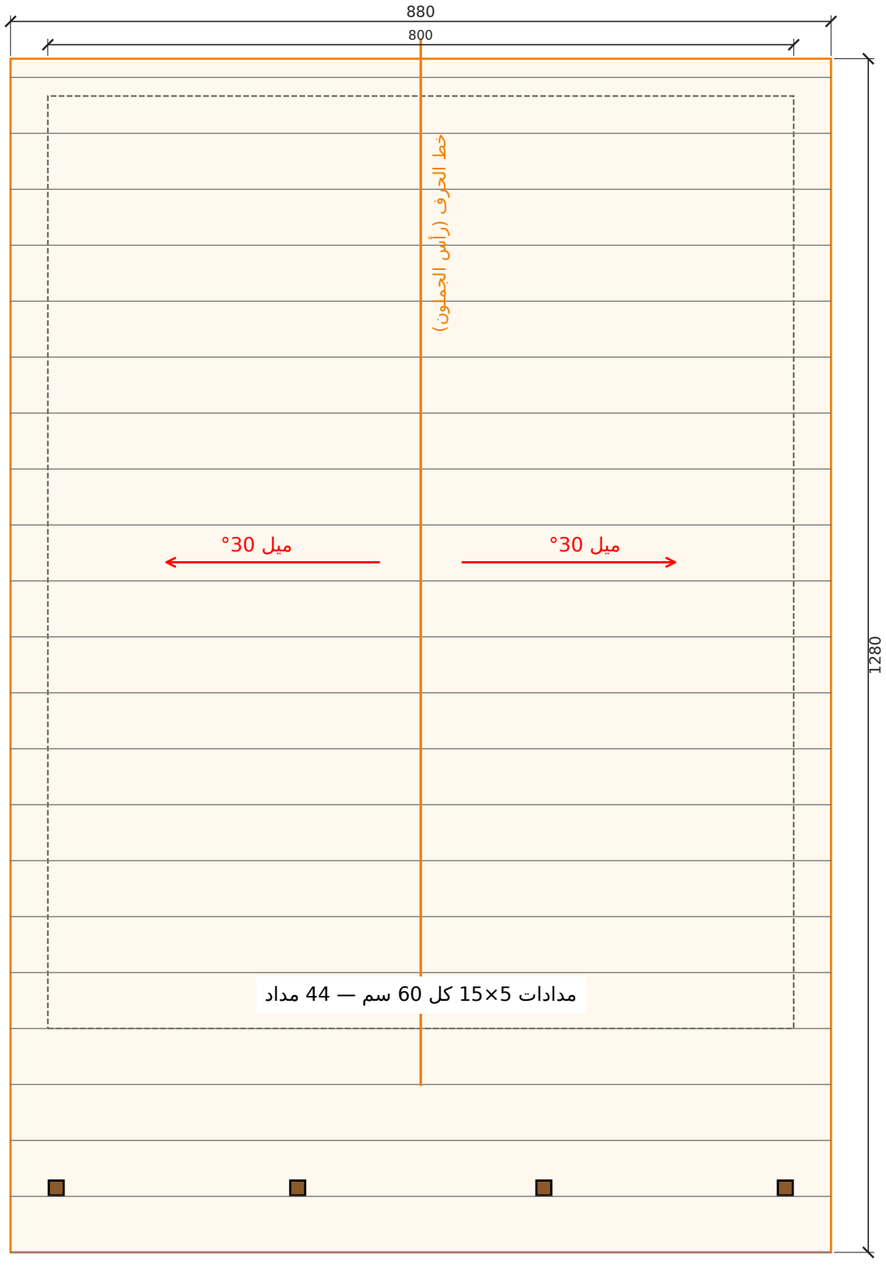

قطاع عرضي أ-أ
مقياس 1:50 | الوحدة: سم

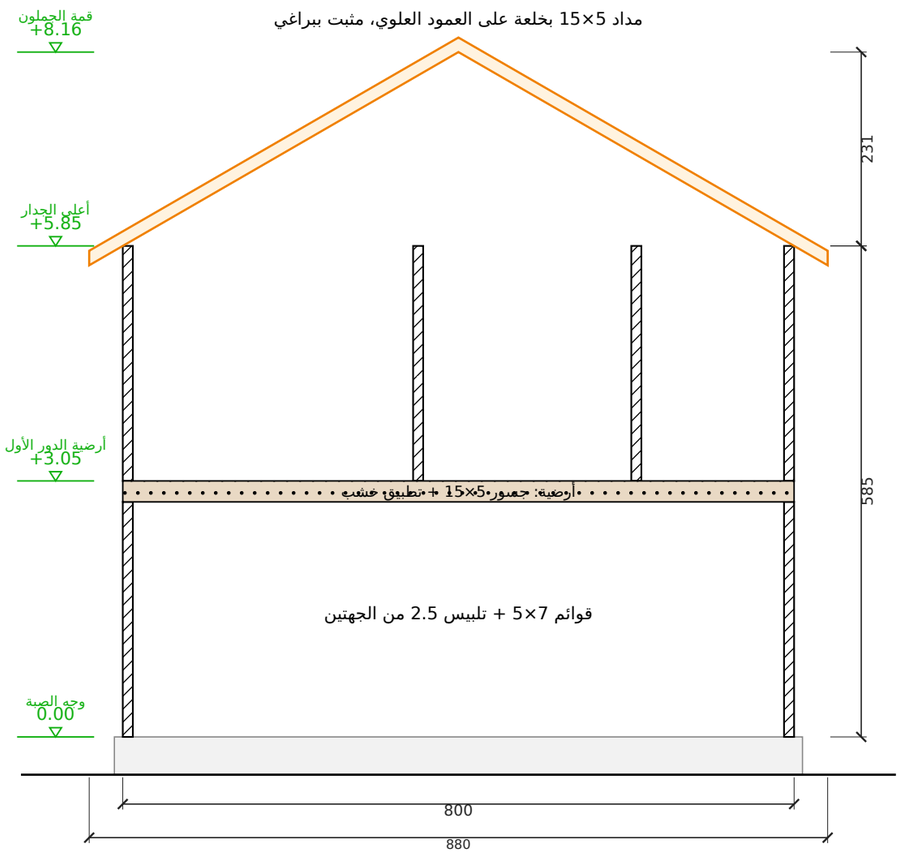

تفصيلة جلوس المداد على العلوي (1:5)

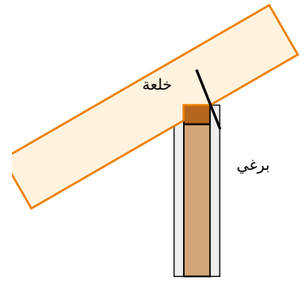

علوي 5×7 على قائم 5×7

المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة عميل جديد — جدة	مسقط السقف والقطاع	1:50	2026-10-18	A-06 (6/15)

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

جدول مقاسات الأبواب والشبابيك
مقاس الفتحة الصافي في الجدار - الوحدة: سم

الرمز	النوع	العرض (سم)	الارتفاع (سم)	ارتفاع الجلسة (سم)	العدد	الموقع
ب1	باب	100	225	-	1	الأمامية (على الحديقة)
ب2	باب	300	240	-	1	الأمامية (على الحديقة)
ب3	باب	70	210	-	3	دورة المياه 2 - حمام الماستر
ب4	باب	80	210	-	3	غرفة 1 - الماستر - غرفة 2
ب5	باب مزدوج	140	220	-	1	الأمامية (على الحديقة)
ب6	باب مزدوج	240	220	-	1	الأمامية (على الحديقة)
ش1	شباك	110	150	75	1	الأمامية (على الحديقة)
ش1	شباك	120	150	75	2	الشرقية - الغربية
ش1	شباك	120	120	90	3	الشرقية 2 - الغربية
ش2	شباك	120	100	110	1	الشرقية
ش3	شباك	60	60	150	3	الخلفية 2 - الشرقية
ش5	شباك	100	110	100	2	الغربية 2

الإجمالي: أبواب 10 - شبابيك 12

جدول المساحات وبيانات المشروع والتسعير

بيانات المشروع

البند	البيان
المشروع	كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة
العميل	عميل جديد — جدة
الموقع	جدة
الاستخدام	سكن خاص / استجمام
التاريخ	2026-10-18
نظام البناء	هيكل خشب 7×5 + تلبيس 2.5 سم من الجهتين
السقف	جملون 30° — قرميد معدني

التسعير

البند	القيمة
المساحة المبنية (م2)	160.00
سعر المتر المربع	1,096 ريال
الإجمالي	**175,360 ريال**

ملاحظات:

- السعر للمساحة المبنية للكوخ (دورين) — التراس والبلكونة والأعمدة مجاناً.
- أعمال الموقع (السور، المسبح، الحديقة، البيارة، الخزان، التمديدات الخارجية) تقديرية بأسعار السوق وتُنفّذ مع مقاول الموقع.

جدول المساحات

م	الفراغ	الأبعاد (م)	المساحة (م2)
1	أرضي — الصالة	7.76 × 5.80	45.01
2	أرضي — الدرج	2.34 × 3.00	7.02
3	أرضي — دورة مياه	1.60 × 2.60	4.16
4	أرضي — المطبخ	3.58 × 3.84	13.75
5	أول — غرفة نوم 1	3.34 × 4.64	15.50
6	أول — غرفة الماستر	4.30 × 4.64	16.28
7	أول — حمام الماستر	1.70 × 1.90	3.23
8	أول — الممر	7.76 × 1.00	7.76
9	أول — دورة مياه (للغرفتين)	1.60 × 3.88	6.21
10	أول — غرفة نوم 2	3.58 × 3.88	13.89
	المساحة الصافية الداخلية		**132.80**
	التراس المسقوف + تراس الدور الأول (مجاناً)	**8.00 × 2.40 × 2**	**33.60**
	المساحة الإجمالية المبنية	**8.00 × 10.00 × 2 دور**	**160.00**

التكلفة التقديرية للمشروع (الكوخ + أعمال الموقع)

البند	الكمية	سعر الوحدة (ريال)	الإجمالي (ريال)
الكوخ الخشبي — سعر المصنع	160 م²	1,096	175,360
السور البلك 2.50 م (قواعد + أعمدة + لياسة ودهان + غطاء خشب)	75 م.ط	550 – 750	41,250 – 56,250
بوابة سيارة 3.80 م حديثة (حديد + شرائح خشب) + باب مشاة	1 مقطوعية	9,000 – 15,000	9,000 – 15,000
المسبح 3.50 × 8.00 × 1.40 (خرسانة + عزل + بلاط + فلتر ومضخة + إنارة)	1 مقطوعية	65,000 – 95,000	65,000 – 95,000
بلاط خارجي (حول المسبح + الممرات + الموقف)	67 م²	110 – 170	7,370 – 11,390
برجولة خشب للجلسة الخارجية + جلسة مبنية	1 مقطوعية	8,000 – 14,000	8,000 – 14,000
المسطحات الخضراء (تربة زراعية + ثيل + شبكة ري + نخيل وأشجار وشجيرات + الأحواض	1 مقطوعية	14,000 – 24,000	14,000 – 24,000
بيارة خرسانية (غرفتين) + التوصيلات	1 مقطوعية	12,000 – 20,000	12,000 – 20,000
خزان أرضي خرساني ≈ 20 م³ + مضخة + خزان علوي	1 مقطوعية	18,000 – 28,000	18,000 – 28,000
تمديدات الكهرباء الخارجية (التغذية + إنارة الحديقة والمسبح والسور)	1 مقطوعية	10,000 – 18,000	10,000 – 18,000
تمديدات السباكة الخارجية (المسبح + الري + الصرف للبيارة + الخزان)	1 مقطوعية	8,000 – 14,000	8,000 – 14,000
الإجمالي التقديري (الكوخ + الموقع)			**368,000 – 471,000**

- الكوخ بسعر المصنع للمتر المربع على المساحة المبنية (دورين) — التراس والبلكونة والأعمدة مجاناً.
- أعمال الموقع تقديرية بأسعار السوق السعودي وتختلف حسب المقاول والمواصفات ونوع التربة — تُعتمد بعرض سعر من المقاول.
- التوفير ممكن: مسبح أصغر أو فايبرجلاس جاهز، سور بلك بدون لياسة خارجية، ثيل صناعي بدل الطبيعي.
- غير شامل: الصبة/القواعد الخرسانية تحت الكوخ، رسوم البلدية والعداد، الأثاث والمكيفات.

التكلفة التقديرية — التجهيزات الداخلية والفرش

البند	الكمية	سعر الوحدة (ريال)	الإجمالي (ريال)
الكهرباء الداخلية — حسب جدول الكميات التفصيلي (الفنار)	1 جدول		13,980 – 19,370
توزيعات الإنارة الداخلية (سبوتات LED + ثريا الصالة + إنارة الدرج والممرات + إنارة البلكونة)	1 مقطوعية	5,000 – 10,000	5,000 – 10,000
مكيف سبليت 18,000 وحدة إنفرتر (الصالة ×2 + الماستر) — شامل النحاس والتركيب	3 جهاز	3,000 – 4,200	9,000 – 12,600
مكيف سبليت 12,000 وحدة إنفرتر (المطبخ + غرفة 1 + غرفة 2) — شامل النحاس والتركيب	3 جهاز	2,300 – 3,200	6,900 – 9,600
ثلاجة دبل دور 18–22 قدم	1 جهاز	2,500 – 4,500	2,500 – 4,500
شاشة بلازما (LED/QLED) 65 بوصة + حامل جداري	1 جهاز	2,500 – 5,000	2,500 – 5,000
فرش الصالة: كنبة 3 مقاعد + كرسيين + طاولة وسط + طاولة تلفزيون + زولية	1 طقم	7,000 – 15,000	7,000 – 15,000
طاولة طعام 6 كراسي	1 طقم	2,500 – 5,000	2,500 – 5,000
غرفة نوم ماستر: سرير 180 + مرتبة + دولاب + كومدينتين + تسريحة	1 طقم	6,000 – 12,000	6,000 – 12,000
غرفة نوم مفردة: سرير 120 + مرتبة + دولاب + كومدينة (غرفة 1 + غرفة 2)	2 طقم	3,000 – 6,000	6,000 – 12,000
ستائر (بلاك أوت + شيفون) مع المجاري — شبابيك وأبواب زجاج الدورين ≈ 20 م.ط	20 م.ط	180 – 320	3,600 – 6,400
إجمالي التجهيزات الداخلية والفرش			**65,000 – 111,000**
الإجمالي الكلي للمشروع (الكوخ + الموقع + التجهيزات والفرش)			**433,000 – 582,000**

• الأسعار تقديرية من السوق السعودي (جدة) وتختلف حسب الماركة والمواصفات — تُعتمد بعروض أسعار من الموردين.
• المكيفات محسوبة حسب مساحة كل فراغ لجو جدة (حار ورطب): الصالة 45 م² بجهازين 18 ألف، الماستر 18 ألف، والباقي 12 ألف.
• غير شامل: أجهزة المطبخ الأخرى (فرن، غسالة، مايكروويف)، السخانات، والديكور والإكسسوارات.

جدول كميات الكهرباء الداخلية — الفنار (ماسة أسود) — الكوخ دورين 160 م²

البند	الكمية	سعر الوحدة (ريال)	الإجمالي (ريال)
فيش 13 أمبير مع مفتاح ماسة أسود (الصالة 7، المطبخ 4، الغرف 4+4+5، الممرات والدرج 3، التراس والبلكونة 2)	29 حبة	22 – 26	638 – 754
فيش ثنائي 13 أمبير 7×14 ماسة أسود (جدار التلفزيون + كاونتر المطبخ)	4 حبة	36 – 41	144 – 164
مفتاح مكيف 45 أمبير ماسة أسود (لكل مكيف سبليت)	6 حبة	46 – 55	276 – 330
مفتاح سخان 20 أمبير ماسة أسود (3 دورات مياه + المطبخ)	4 حبة	38 – 44	152 – 176
مفتاح ثلاثي ماسة أسود (المدخل + باب الحديقة)	2 حبة	20 – 24	40 – 48
مفتاح ثنائي/مجوز ماسة أسود (المطبخ، التراس، الغرف الثلاث)	5 حبة	16 – 20	80 – 100
مفتاح مفرد ماسة أسود (دورات المياه، الممرات، البلكونة، الدرج تحت/فوق)	9 حبة	9 – 11	81 – 99
فيش دش/تلفزيون ماسة أسود (الصالة + الماستر + غرفة)	3 حبة	23 – 27	69 – 81
فيش انترنت/كمبيوتر ماسة أسود (الصالة + الماستر)	2 حبة	35 – 40	70 – 80
قاطع حساس الفنار 1 قطب (إنارة 4× 10A، أفياش 6× 20A، سخانات 4× 20A)	14 حبة	20 – 30	280 – 420
قاطع حساس الفنار C32 (مكيفات 6× + أجهزة المطبخ 2×)	8 حبة	25 – 35	200 – 280
قاطع رئيسي 2 قطب 63A + قاطع تسريب أرضي RCCB	1 طقم	220 – 380	220 – 380
لوحة توزيع الفنار 24 خط مدفونة (لوحة رئيسية) + لوحة 12 خط للدور الأول	1 طقم	450 – 750	450 – 750
سلك الفنار 1.5 ملم لفة 500 قدم (الإنارة — أحمر/أسود/أصفر-أخضر)	4 لفة	190 – 240	760 – 960
سلك الفنار 2.5 ملم لفة 500 قدم (الأفياش)	6 لفة	285 – 330	1,710 – 1,980
سلك الفنار 4 ملم لفة 500 قدم (السخانات + المكيفات 12 ألف)	3 لفة	430 – 500	1,290 – 1,500
سلك الفنار 6 ملم لفة 500 قدم (المكيفات 18 ألف + تغذية اللوحة الفرعية)	2 لفة	600 – 720	1,200 – 1,440
كيبل التغذية الرئيسي من العداد للوحة (4×16 ملم) — تقريبي 25 م	25 م	45 – 65	1,125 – 1,625
مواسير PVC 20/25 ملم + أكواع + علب 7×7 و 7×14 + لوازم	1 مقطوعية	1,200 – 1,800	1,200 – 1,800
أجور كهربائي (تمديد + تركيب + تشغيل وفحص) — دورين	160 م²	25 – 40	4,000 – 6,400
إجمالي الكهرباء الداخلية			**13,980 – 19,370**

- الكميات محسوبة من المساقط (عدد الأفياش والمفاتيح لكل غرفة + مكيف ومفتاح لكل غرفة + سخان لكل دورة مياه) — تُراجع مع الكهربائي بالموقع.
- الأسعار من متاجر سعودية (أكتوبر 2026) لمجموعة الفنار ماسة أسود بيانو وأسلاك الفنار 500 قدم وقواطع حساس — قد تختلف حسب الموزع.
- الإنارة (سبوتات/ثريا) والمكيفات محسوبة في لوحة التجهيزات والفرش.

المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة **عميل جديد — جدة**	**جدول كميات الكهرباء**	—	**2026-10-18**	**A-11 (11/15)**


مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

لقطات المنظور الخارجي


المنظور الأمامي




منظور أمامي من اليسار

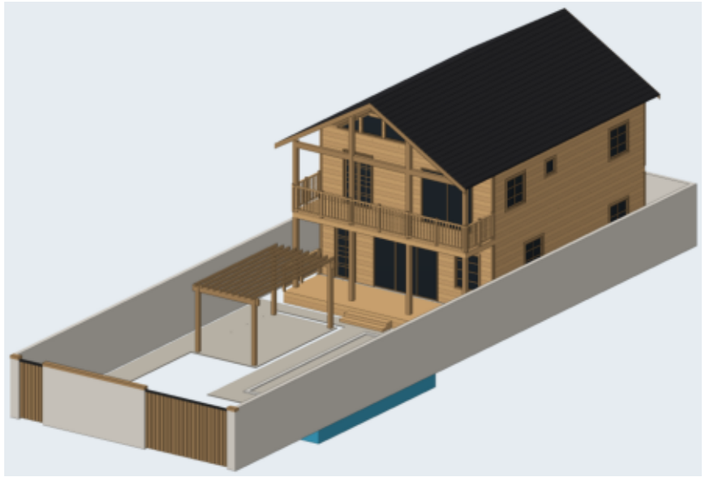


منظور أمامي من اليمين

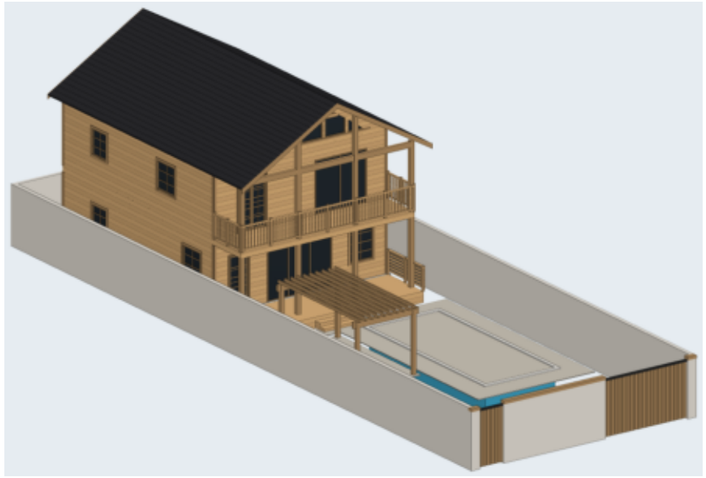


المنظور الخلفي

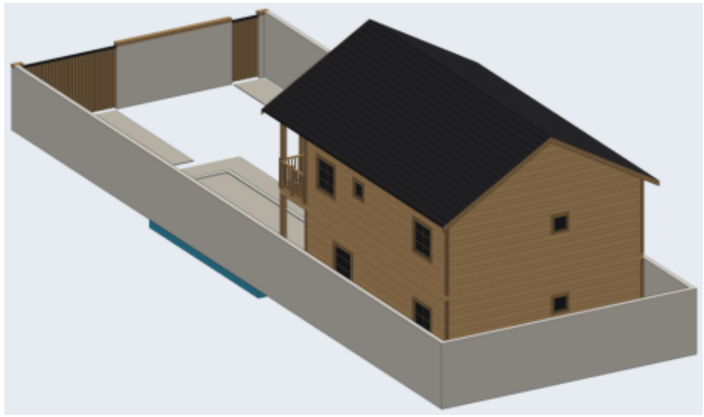

منظور خلفي من اليمين

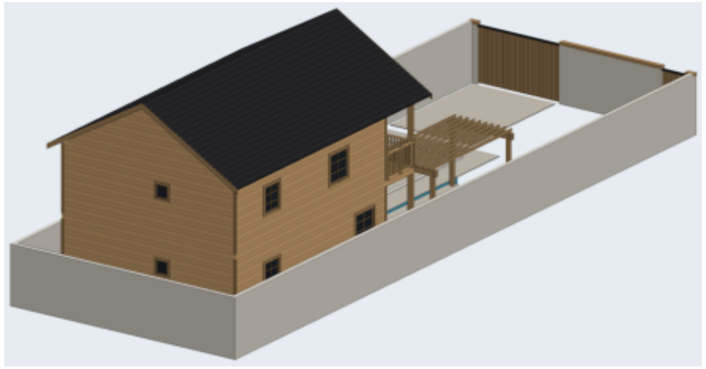

منظر علوي

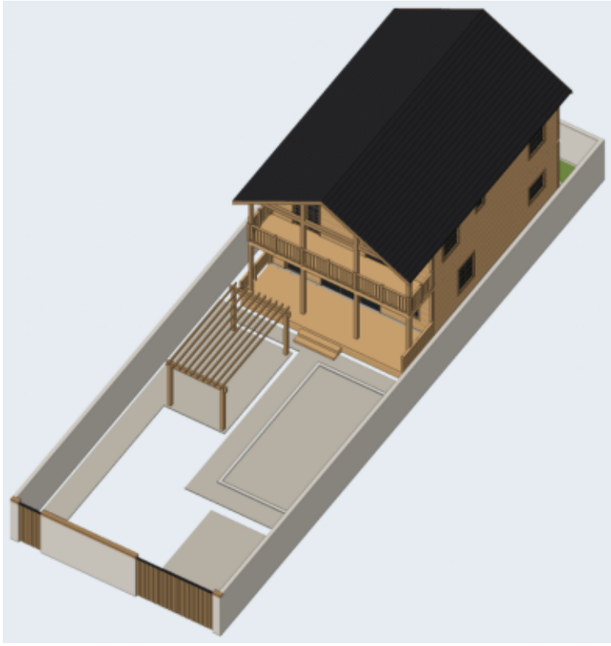


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة **عميل جديد — جدة**	**لقطات المنظور**	**—**	**2026-10-18**	**A-12 (12/15)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

المقطع العلوي بالفرش — الدور الأرضي

مقطع أفقي على ارتفاع 1.90 م — توزيع الفرش ومسار الحركة

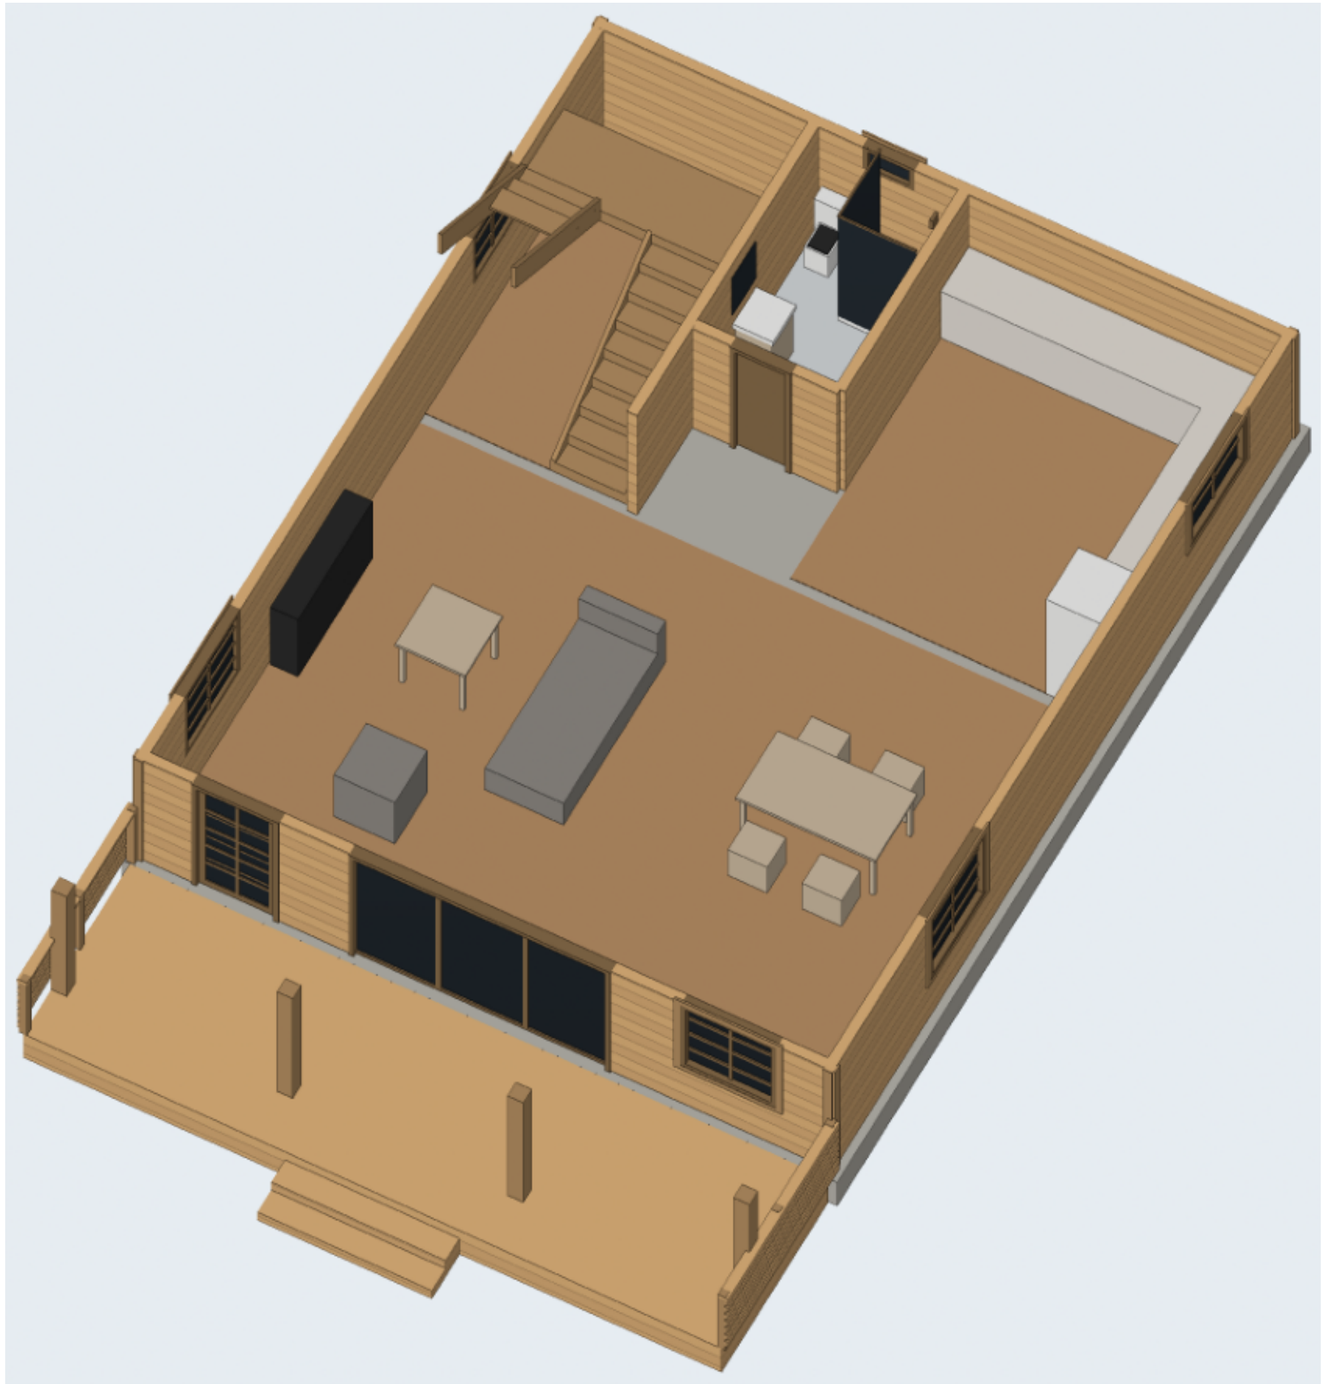


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة **عميل جديد — جدة**	**المقطع العلوي بالفرش — الدور الأرضي**	**—**	**2026-10-18**	**A-13 (13/15)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

المقطع العلوي بالفرش — الدور الأول

مقطع أفقي على ارتفاع 1.90 م — توزيع الفرش ومسار الحركة

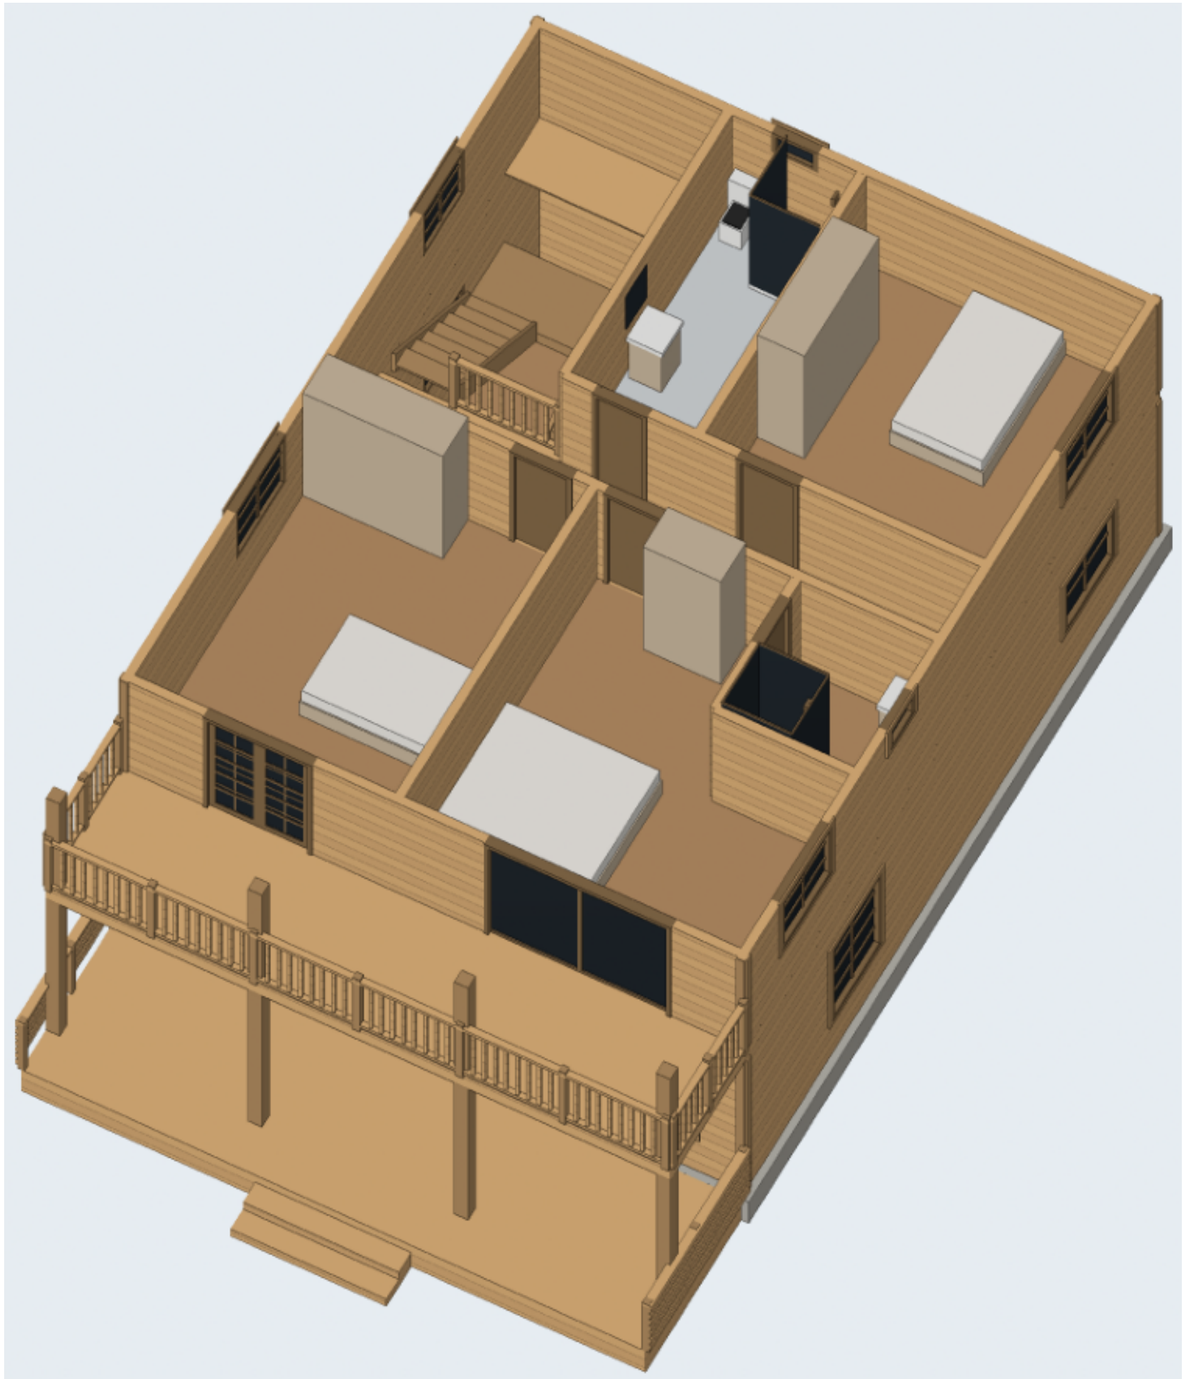


المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة **عميل جديد — جدة**	**المقطع العلوي بالفرش — الدور الأول**	**—**	**2026-10-18**	**A-14 (14/15)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory

المنظور ثلاثي الأبعاد والمواد

النمط: جوزي غامق + إطارات سوداء — رندر واقعي بخامات حقيقية

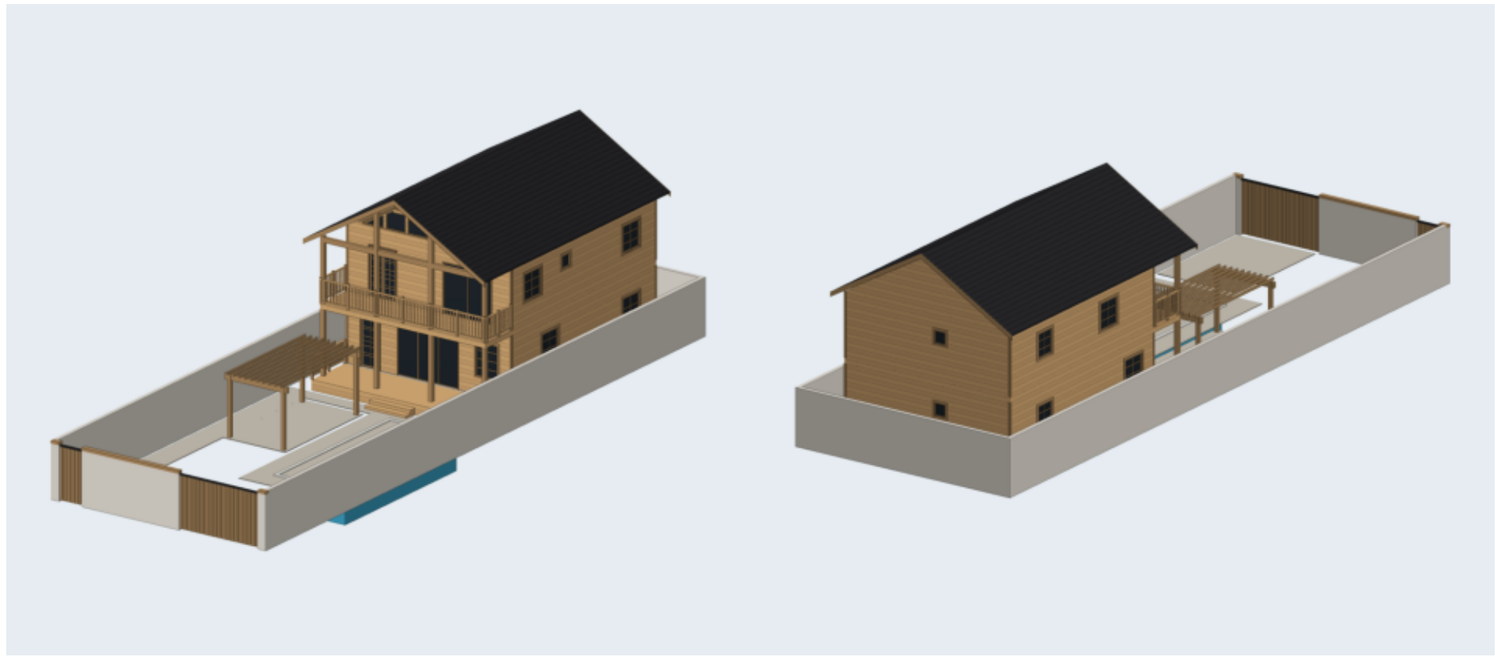

جدول المواد والألوان

الخشب / الصبغة

خشب طبيعي فاتح (بدون صبغة)

القرميد

قرميد رمادي غامق

الزجاج

زجاج عاكس غامق

إطارات الشبابيك والأبواب

إطار خشب بنفس الصبغة أغمق

الكنار والزوايا

نفس الصبغة أغمق درجة


الصبة

خرسانة 45 سم


الدربزين: ألواح أفقية متقاربة (عصري)

تقسيم الشبابيك: بدون | الباب الرئيسي: زجاج بتقسيمات (فرنسي)

أنواع الدربزين المعتمدة (من مشاريع المصنع)

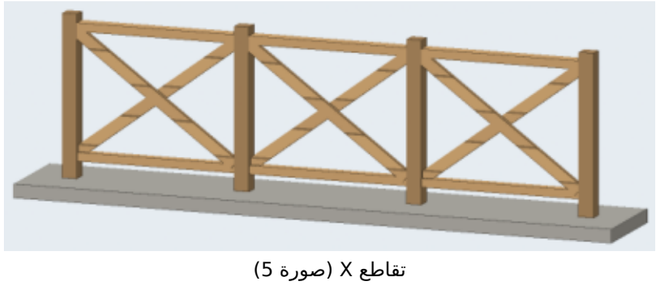

تقاطع X (صورة 5)

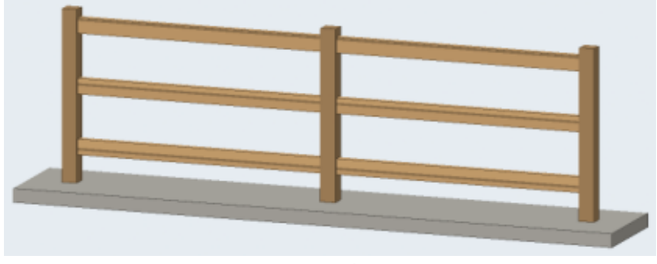

3 مرابيع أفقية (صورة 2)



قوائم رأسية متقاربة (صورة 1)

المشروع / العميل	عنوان اللوحة	المقياس	التاريخ	رقم اللوحة
كوخ دورين + تنسيق حديقة ومسبح — جدة **عميل جديد — جدة**	**المنظور والمواد**	**—**	**2026-10-18**	**A-15 (15/15)**

مصنع وتد الأخشاب
Watad Wood Factory
